

第二小・第四中学校改築工事

（仮設校舎工事説明会）

令和5年（2023年）9月25日


八王子市教育委員会

学校教育課学校施設課

配置計画

2


現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

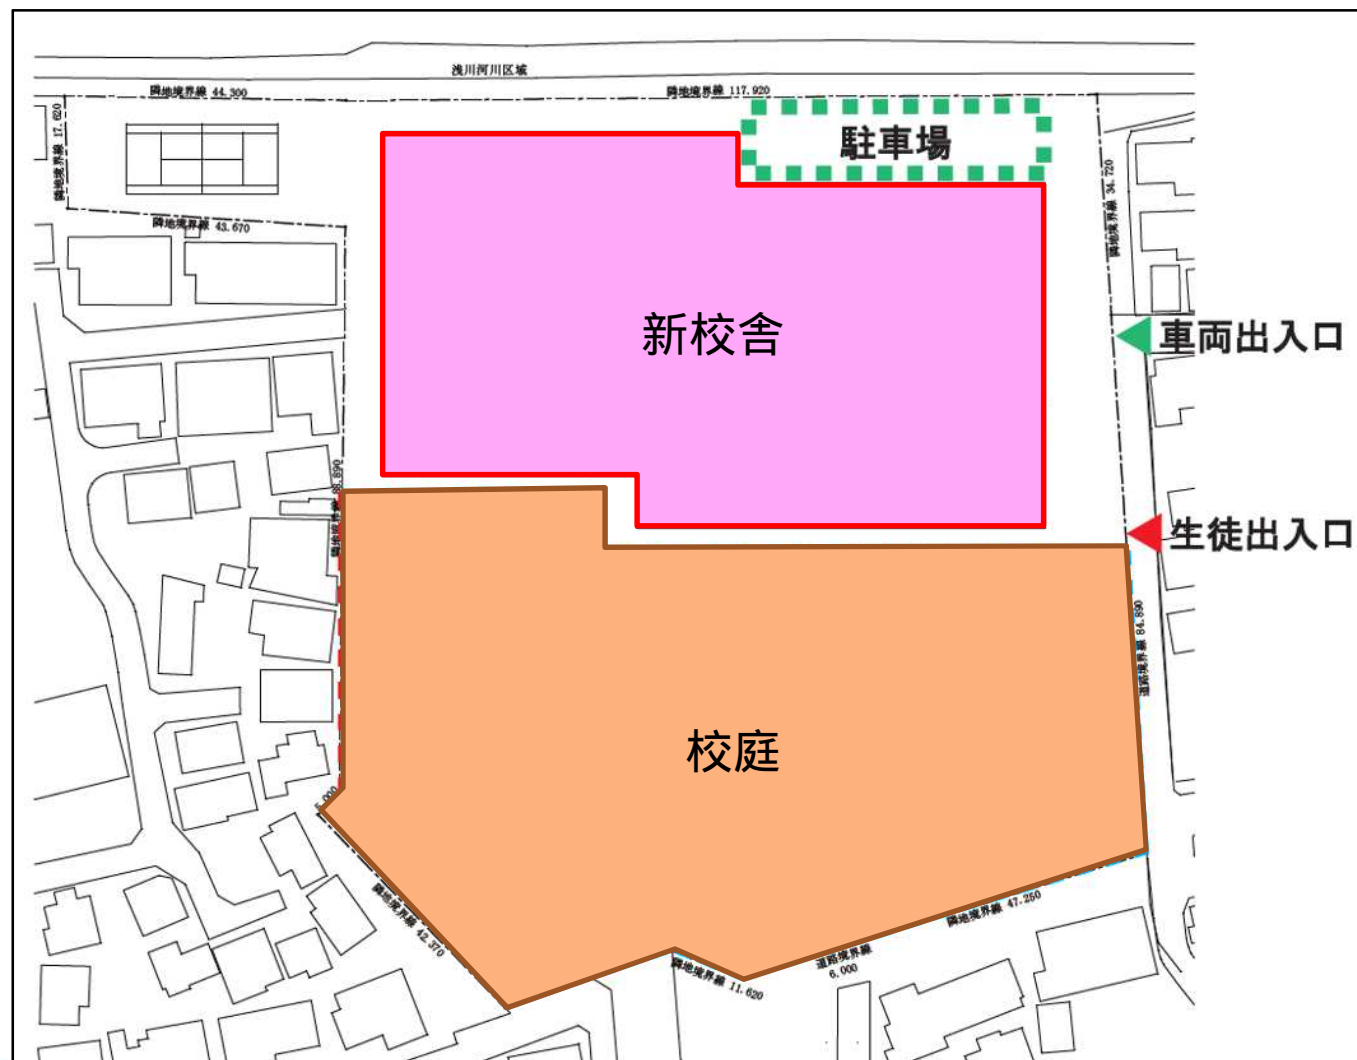

事業計画

工事ステップ1 (仮設校舎建築工事)

3

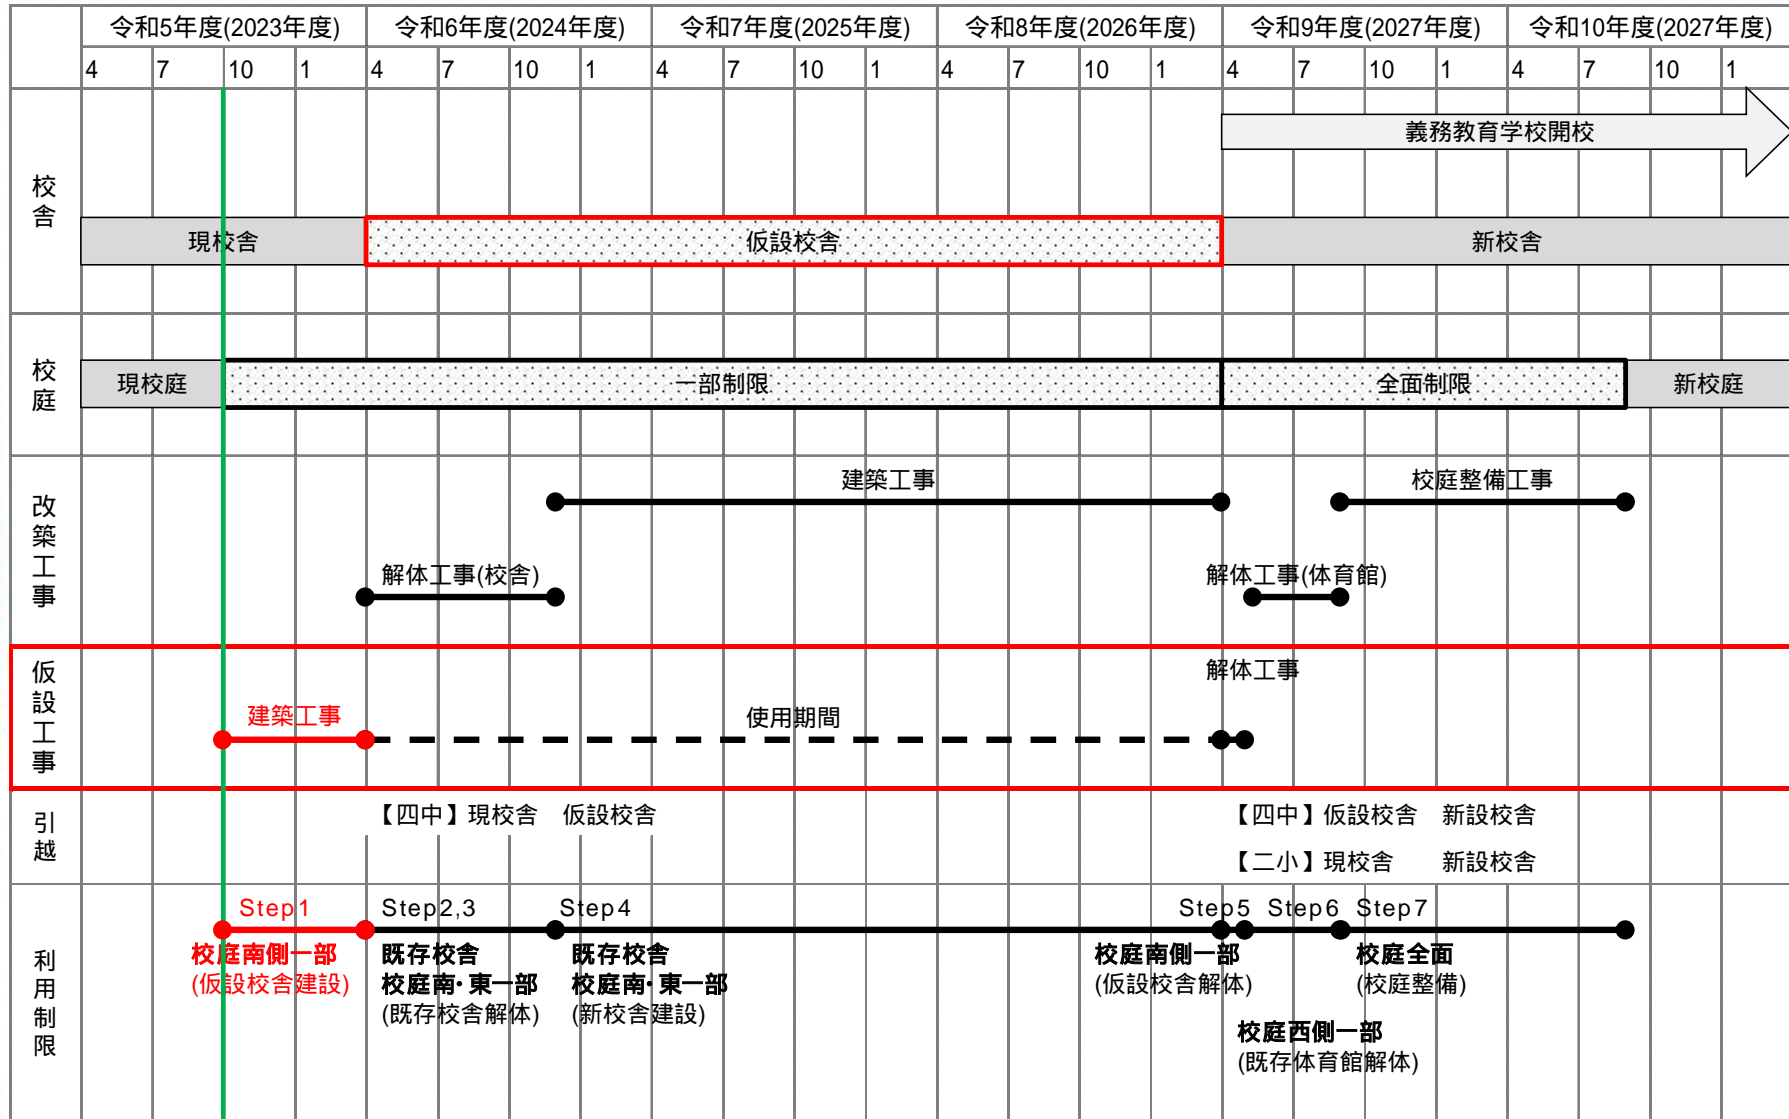

ステップ図


(令和5年3月23日説明資料)

工事ステップ 1 R5年10月～R6年3月

5

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step. 1 仮設校舎建設、第四中学校引越し

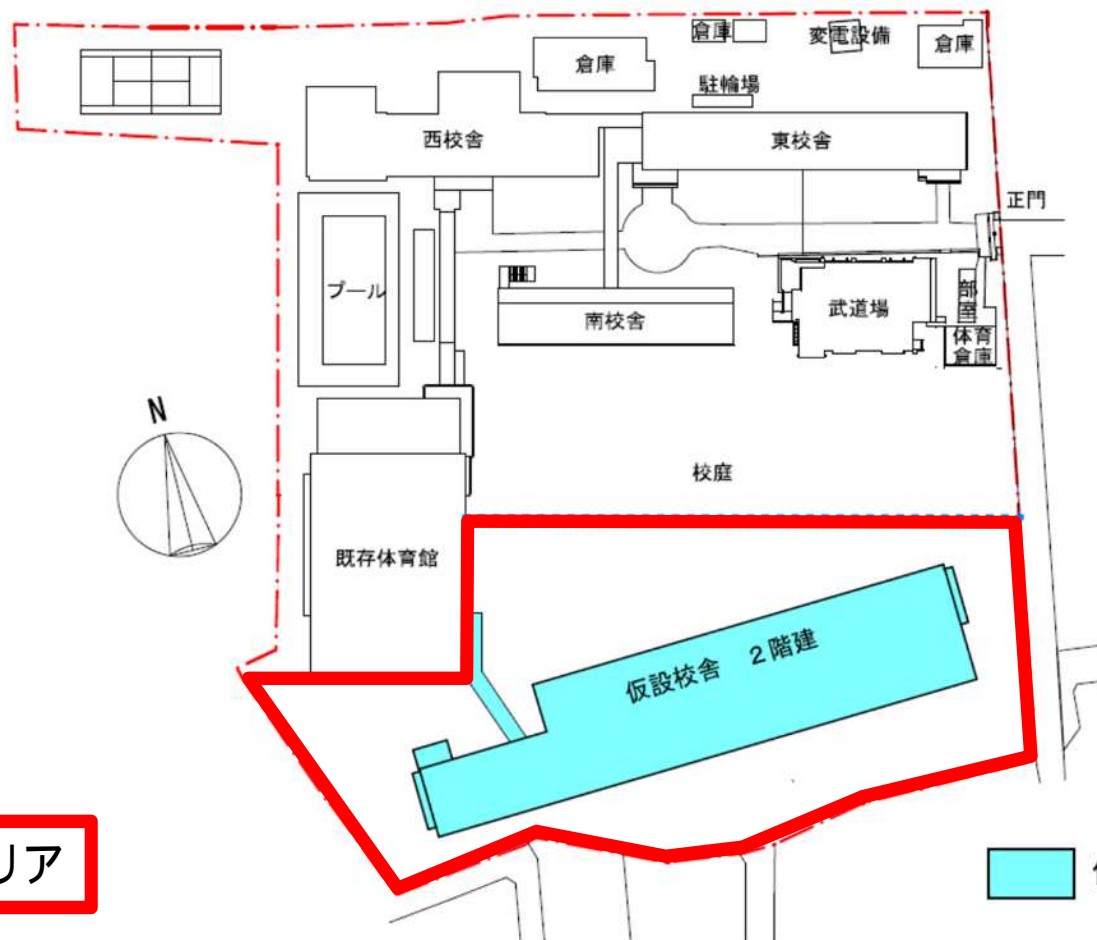

工事エリア


仮設建築物

工事ステップ 2 R6年4月

6

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step.2 仮設工事（仮囲い等）

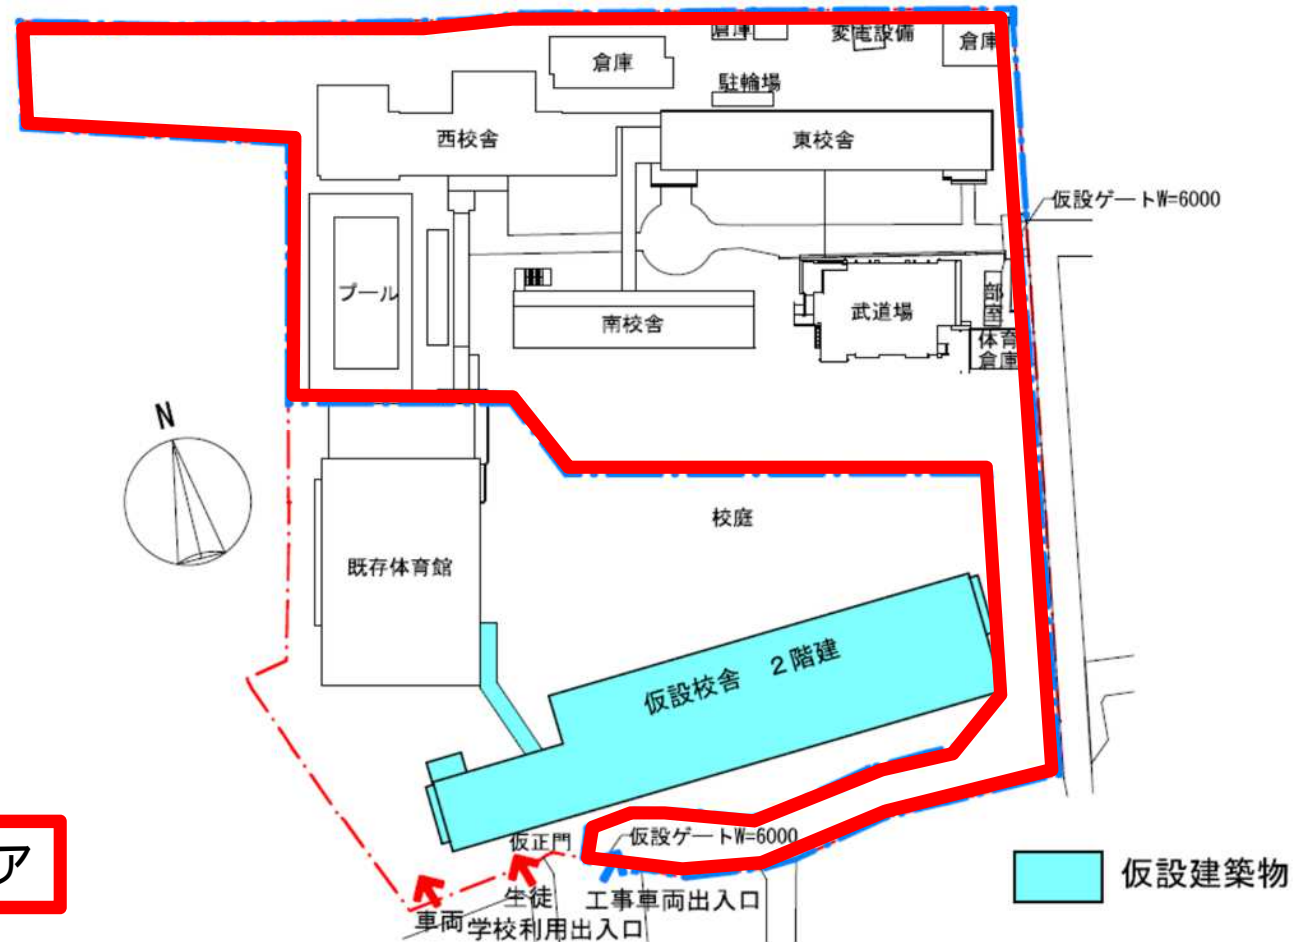

工事エリア

仮設建築物


工事ステップ 3

R6年5月～R6年11月

7

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step. 3 第四中学校既存校舎・武道場・プール解体

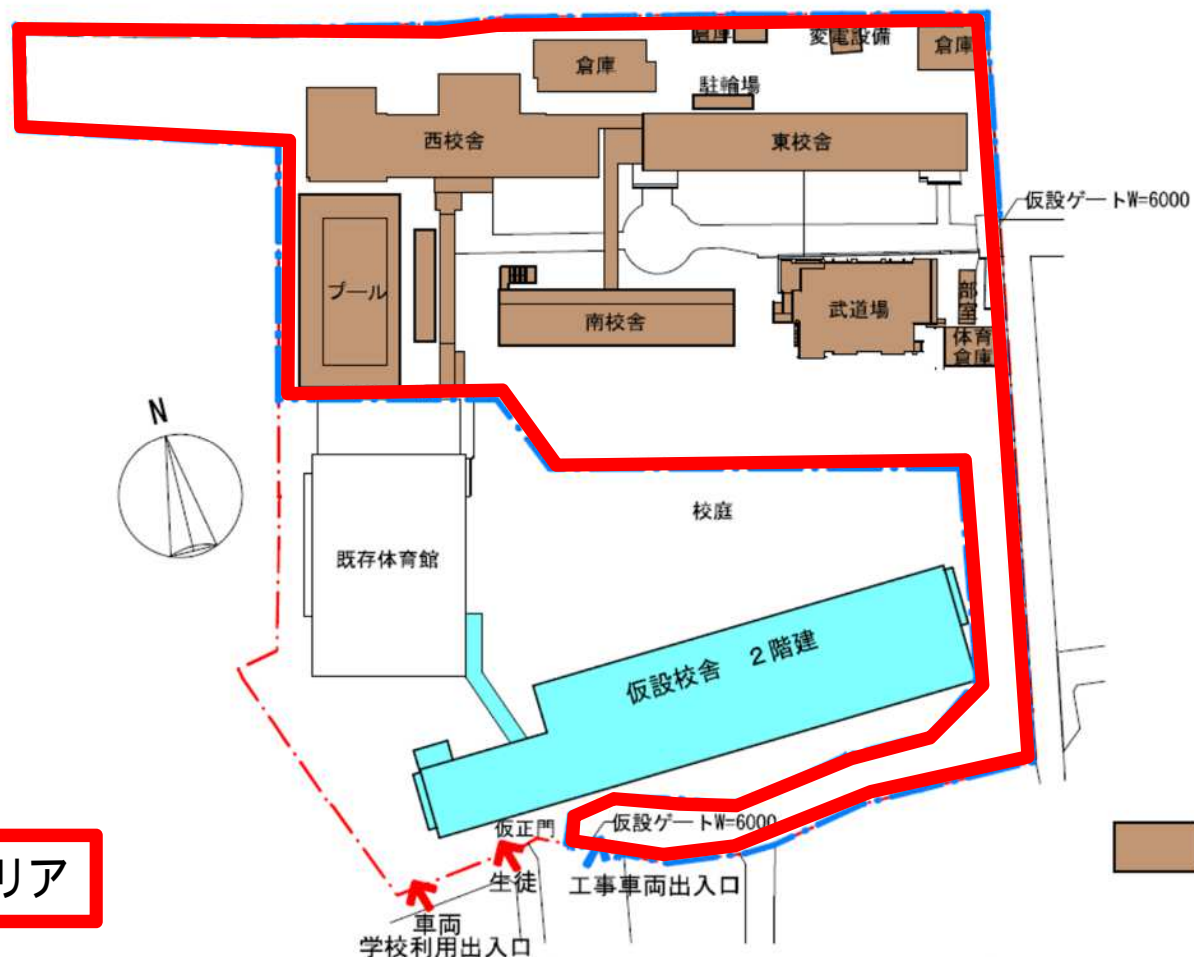

工事エリア


工事ステップ 4

R6年12月～R9年2月

8

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step. 4 新設校舎建設

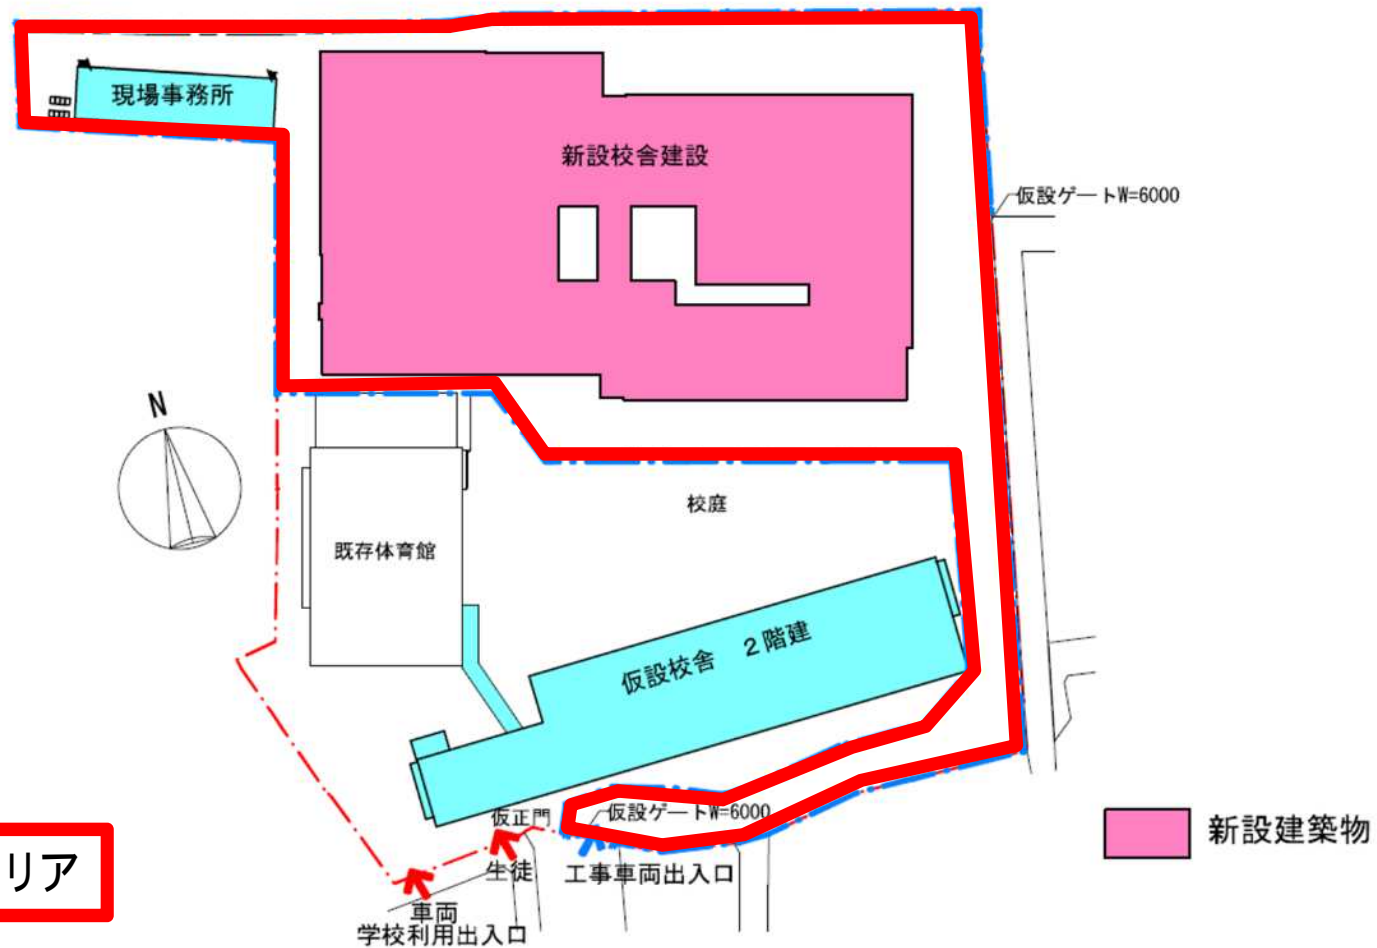


工事ステップ 5 R9年3月～R9年4月

9

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step. 5 新設校舎完成・引越し、仮設校舎解体、工事仮設撤去

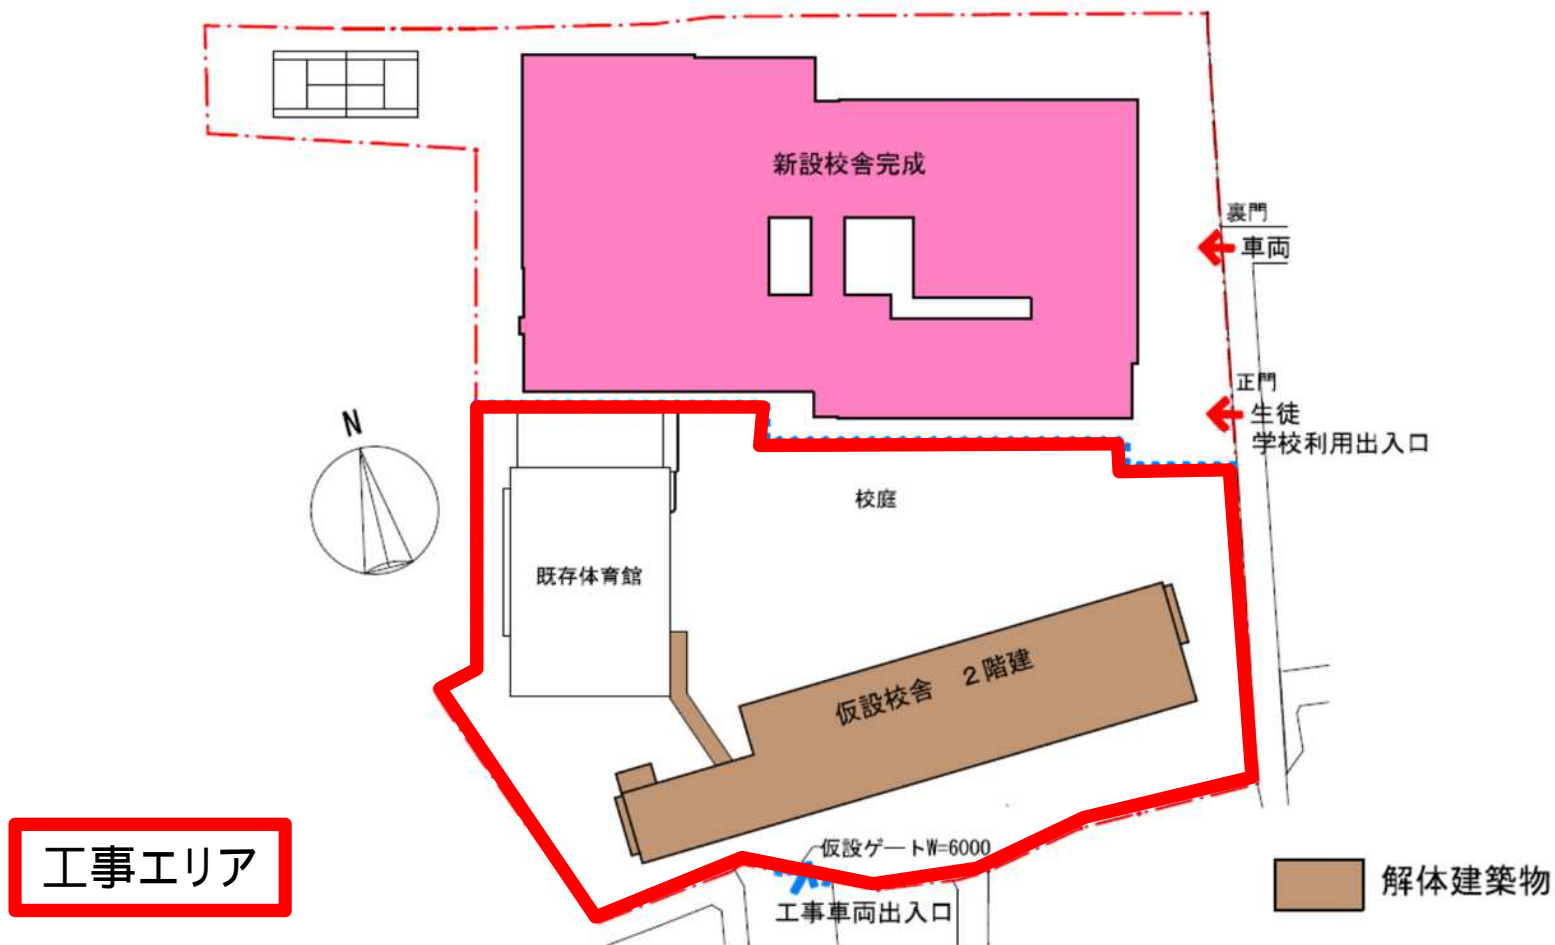


工事ステップ 6

R9年5月～R9年8月

10

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step. 6 既存体育館解体

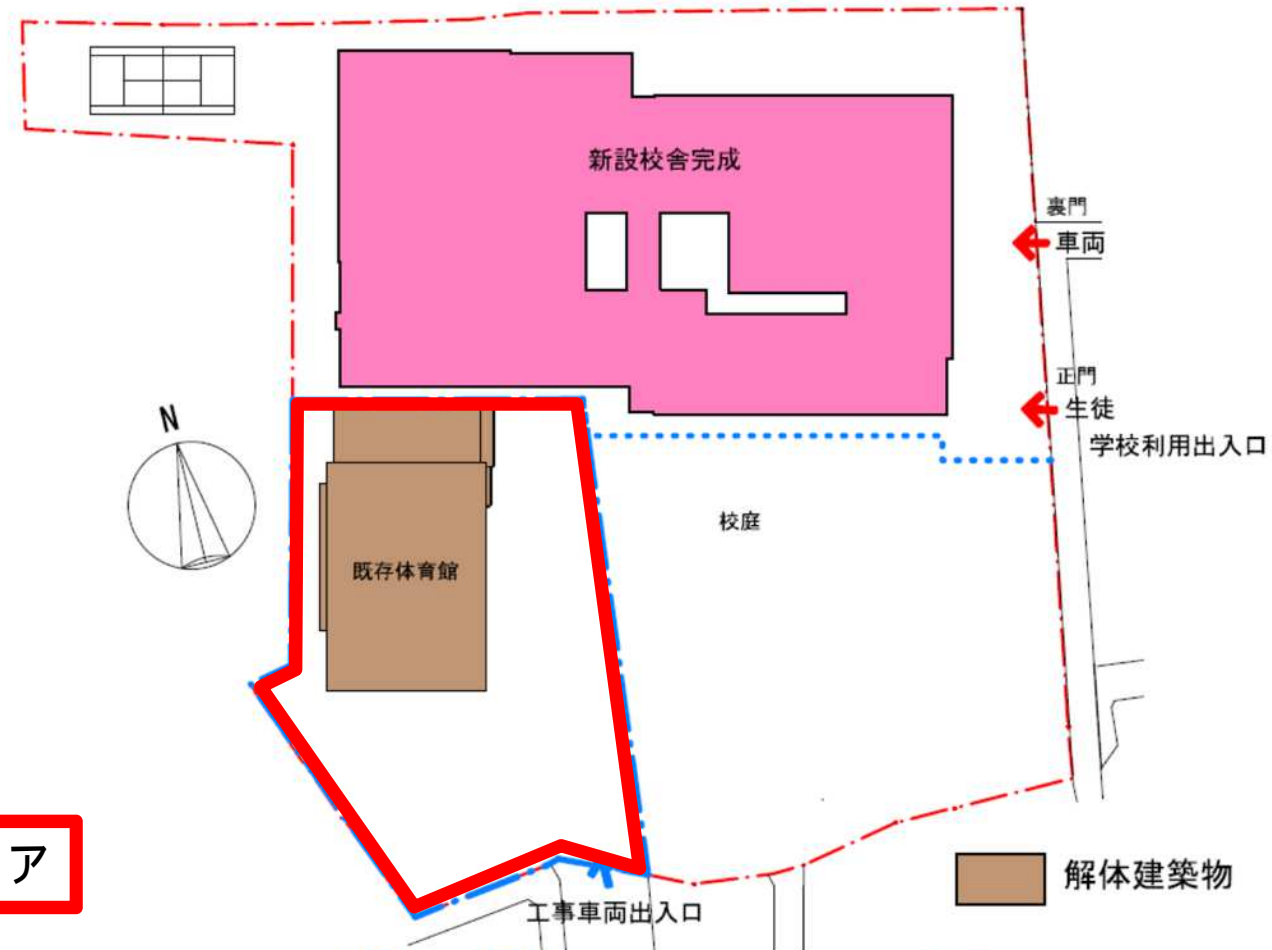


工事ステップ 7 R9年9月～R10年8月

11

現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。

Step.7 外構・校庭整備

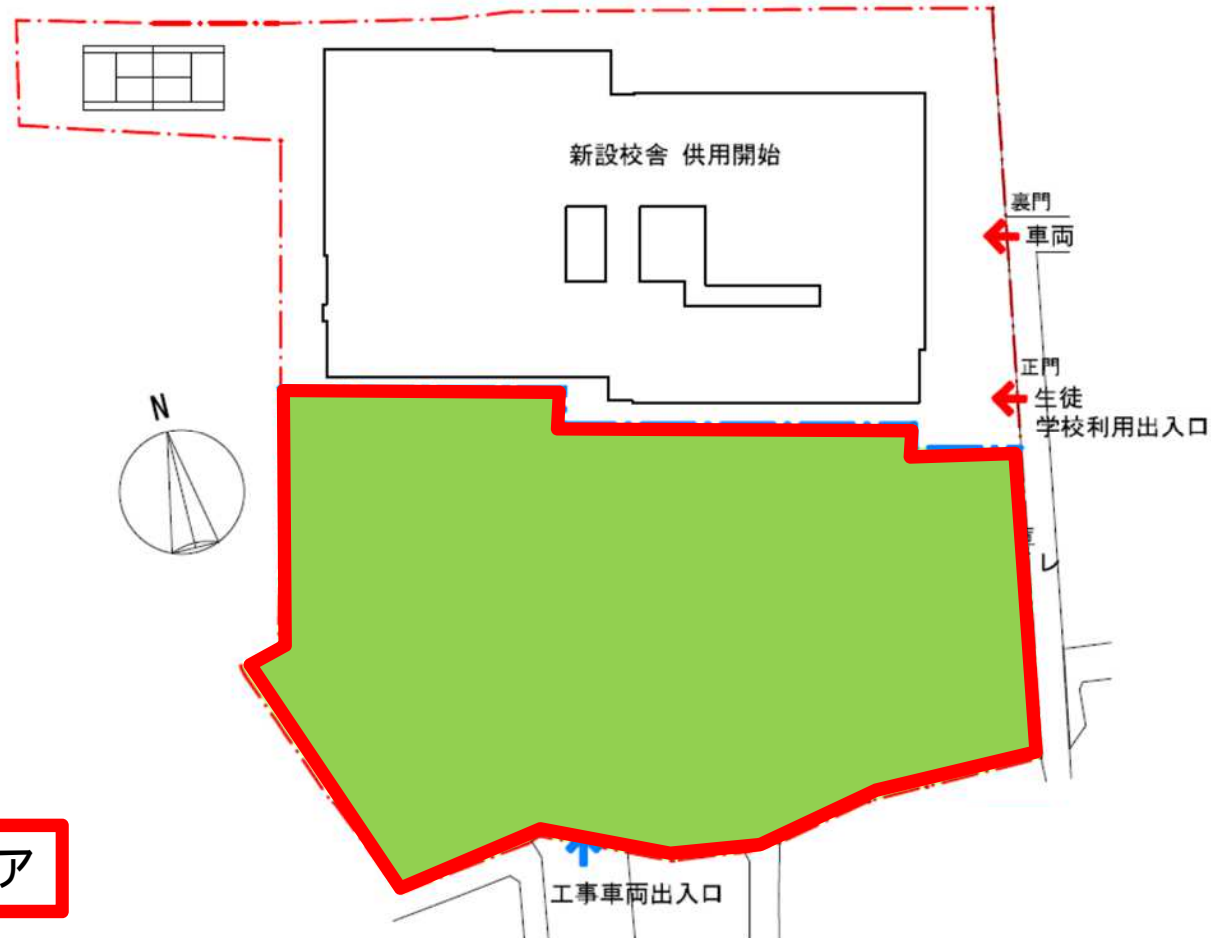

工事エリア

工事ステップ 1

(仮設校舎建築工事)

工事ステップ 1

R5年10月～R6年3月

13

Step. 1 仮設校舎建設、第四中学校引越し


配布

校庭
面積：1,900㎡
横：90m
縦：19～32m
浅川河川敷(約2,500㎡)が
軽運動スペースとして
使用可能です。

作業時間
8:30～17:30

作業日
月～土曜日

日曜日・祝日は原則作業中止ですが、
軽作業については実施する可能性があり、その際は事前に連絡をします。

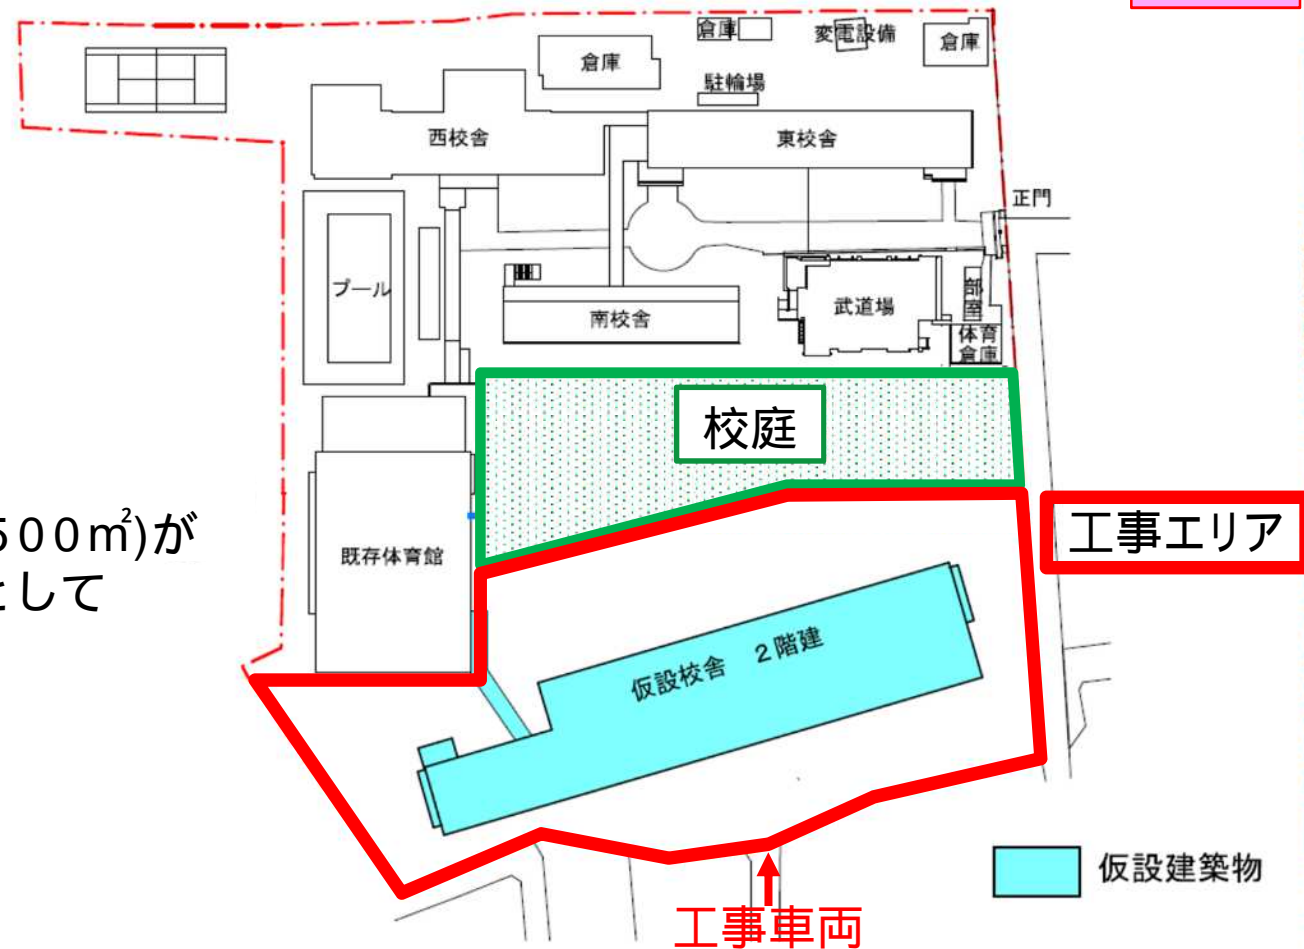

工事エリア

工事車両


仮設建築物

浅川河川敷



仮設校舎

仮設校舎 配置図

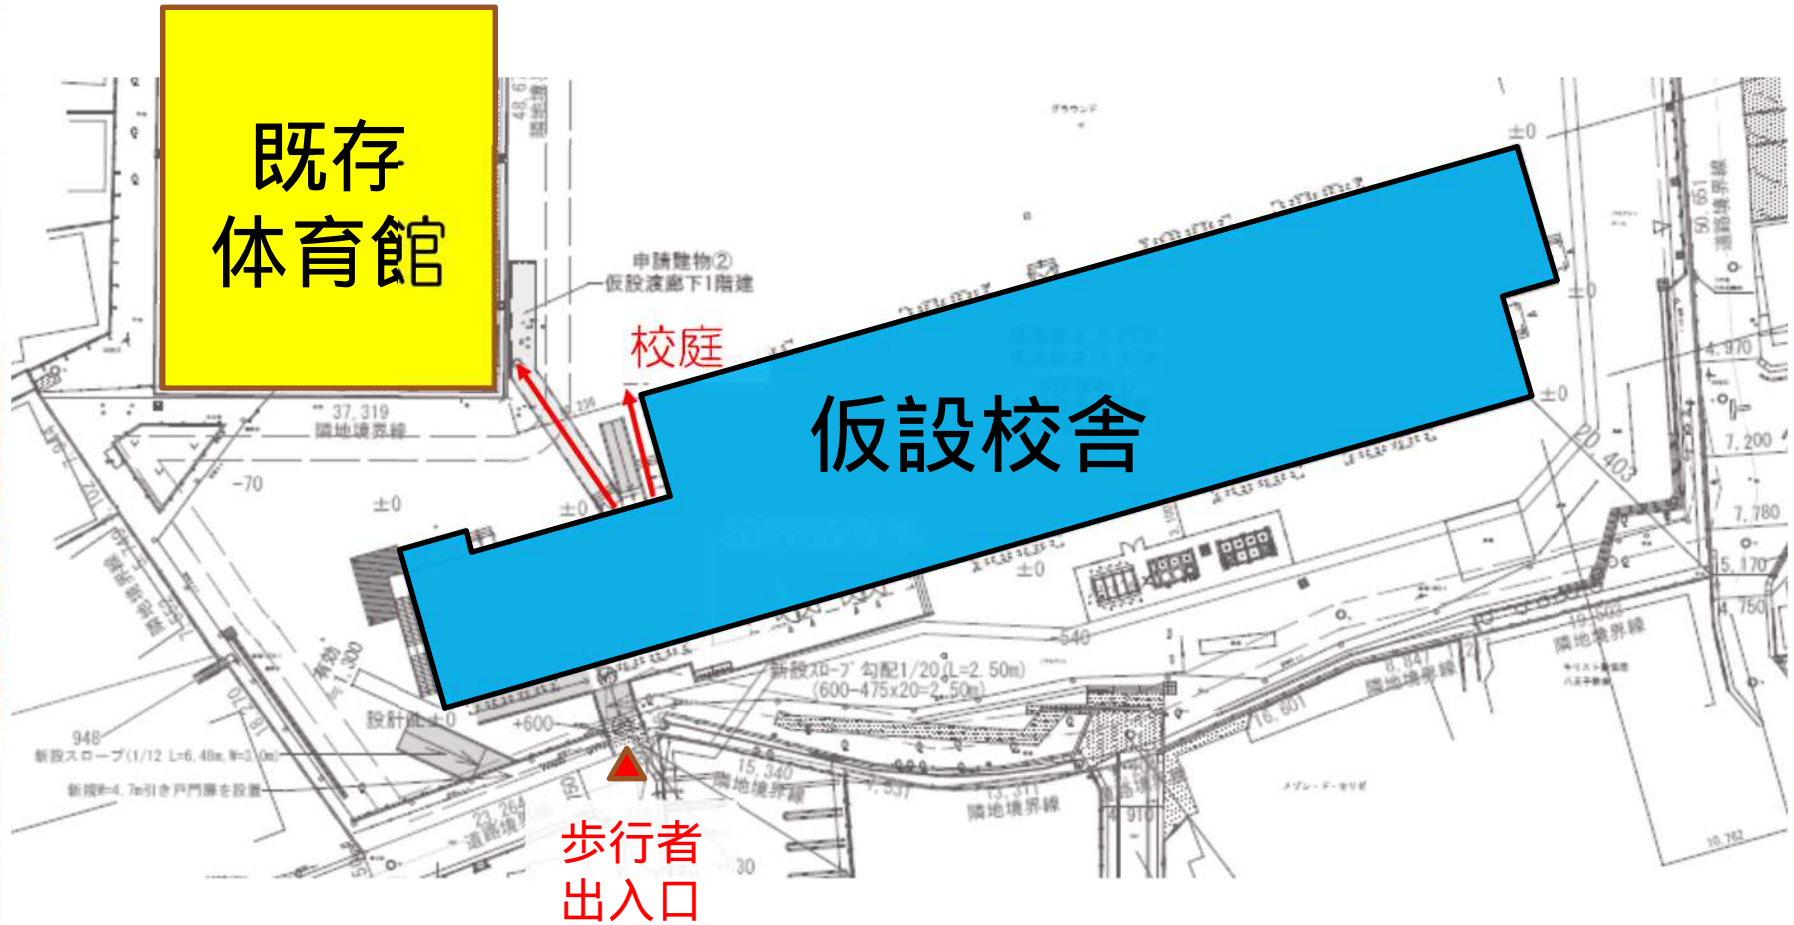


仮設校舎 平面図

18

2階平面図



1階平面図

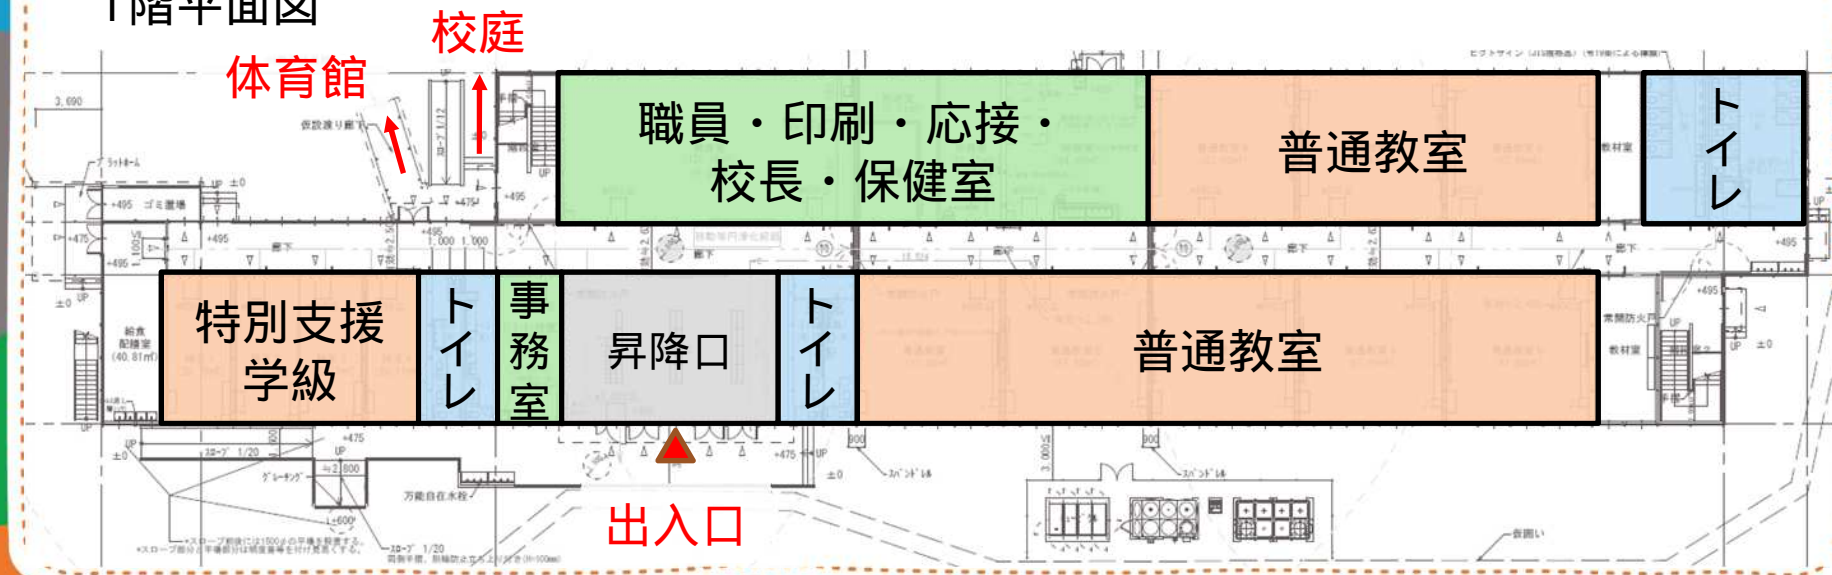

(参考) 仮設校舎 外観イメージ

19



中学校 仮設校舎

STANDARD SCHOOL-type

スタンダード スクールタイプ

(参考) 仮設校舎 内観イメージ

20



【普通教室・内観写真】（教室後方）

工事計画

(立川ハウス工業より)

工事の説明

22

作業時間について

- | | |
|------------|--|
| 1) 作業日 | 月曜日～土曜日 |
| 作業時間(原則) | 8:30～17:30
・前後30分間は工事の朝礼・点検等及び清掃片付けを行います。
・コンクリート打設等中断できない作業については延長して作業する場合があります。
※ 強風・台風時に際しては安全を確保してから退所致します。 |
| 重機作業 | 8:30～17:00 |
| 車両通行(登校時間) | 7:30～8:30 ※大型車両は、通行・入場禁止と致します。
但し工事従事者の通勤車両等は、午前7:30前に入場と致します。 |
- 2) 原則日曜日、祝日は作業を行いません。
ただし、軽作業・事務所内の作業等については行う場合があります。

工事車両経路図



工事車両経路図

工事中通行する車両

24

大型ユニック車



ラフタークレーン車



大型ダンプトラック



大型回送車



大型ミキサー車



小型ポンプ車



工事中使用する主な機械

25

油圧ショベル



小型油圧ショベル



質疑応答

終了

工程表（参考）

		工程表																				着工年月日			完成年月日			延日数							
施主名		八王子市市役所																		令和5年10月10日			令和6年3月31日			172日									
工事名称		八王子市立第四中学校仮設校舎等設置費掛																		令和5年10月10日			令和6年3月31日			172日									
		2023年																				2024年													
月日		8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月						
工事区分		1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	5	10	20
仮設・解体工事		建設許可申請～計画通知																																	
基礎工事																				現場準備															
本体工事																																			
屋根工事																																			
鋼筋建具工事																																			
内装下地工事																																			
内装仕上工事																																			
外構工事																																			
給排水設備工事																																			
電気設備工事																																			
空調設備工事																																			
行政検査・是正																							検査												
引っ越し																							使用開始												
大型車両 4t～10t車																																			
備考		※作業時間について 1)月曜日～土曜日 作業時間 8:00～17:30 2)原則日曜日、祝日は作業を行いませんが軽作業については行う場合があります。(その際は事前連絡を致します。)																																	
																									立川ハウス工業株式会社										
